




МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Формирование отчетов о ходе реализации Федеральных проектов



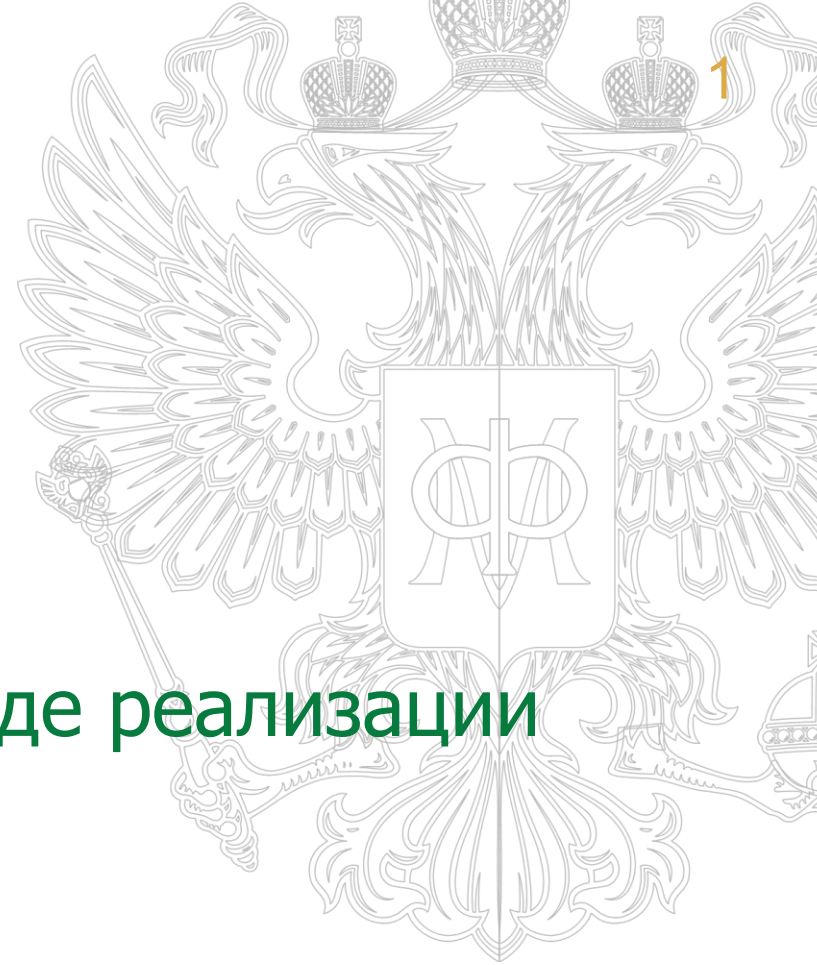

В целях подготовки к формированию отчетов о ходе реализации федеральных и национальных проектов, необходимо

Кому	В срок	Что делать	Где	Условие	Перечень полномочий, которым предоставлена возможность формирования отчета
Формирование отчета осуществляется ответственными участниками федерального проекта	до 12 сентября 2019 г.	Сформировать месячный отчет о ходе реализации федерального проекта за август 2019 года	В подсистеме «Электронный бюджет» в паспорте федерального проекта, с последующей печатью отчетов и их подписью для предоставления их в бумажном виде	Формирование информации необходимо осуществлять в отчетном периоде август 2019	Руководитель федерального проекта/Администратор федерального проекта/Участник федерального проекта
Формирование отчета осуществляется ответственными участниками национального проекта	до 17 сентября 2019 г.	Сформировать месячный отчет о ходе реализации национального проекта за август 2019 года	В подсистеме «Электронный бюджет» в паспорте национального проекта, с последующей печатью отчетов и их подписью для предоставления их в бумажном виде	Формирование информации необходимо осуществлять в отчетном периоде август 2019	Руководитель национального проекта/Администратор национального проекта/Участник национального проекта



Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 30.07.2019) "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"

Основные шаги для формирования отчета в информационной системе

Шаг 1: Информация по Мероприятиям (Ответственными за исполнение)	Шаг 2: Информация по Контрольным точкам (Ответственными за исполнение)	Шаг 3: Информация по значению результата (Ответственными за результат)	Шаг 4: Информация по результату (Ответственными за результат)	Шаг 5: Информация по Сводным рискам (Ответственными за формирование отчета)	Шаг 6: Формирование отчета (Ответственными за формирование отчета)
--	--	--	---	---	--



В разделе 10.1 «Периодический мониторинг» представлена информация по контрольным точкам, мероприятиям и результатам:

- Срок исполнения в текущем периоде – срок исполнения которых в выбранном периоде.
- Срок истек – срок исполнения которых истек
- В прогнозном периоде – срок исполнения которых в прогнозном периоде (+3 мес.)

Сведения о достижении результатов

Наименование	План	Факт/Прогноз	Просрочка	Статус исполнения	Достижение
	Дата окончания				
Р3.01.04 Не менее 70 процентов лиц старше ...		15.12.2019			
23,0000	15.12.2019	15.12.2019	0	Отсутствие отклонений	В работе
(01) Утверждены (одобрены, сформир...	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено
(03) Внесены изменения в порядок ...	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено
Р3.01.21 Прирост технической готовности об...					
1,0000	22.12.2019	22.12.2019	0	Отсутствие отклонений	В работе
(01) Земельный участок предоставлен заказчику	31.08.2019	15.09.2019	15	Наличие некритических отклонений	В работе
(01) Обеспечение заключение конт...	31.08.2019	15.09.2019	15	Наличие некритическ...	В работе



1. Для внесения исполнения по контрольной точке в паспорте федерального проекта в разделе 10.1 за определенный месяц необходимо выбрать в дереве слева необходимый месяц (1)
2. Выбрав контрольную точку, переходим к ее заполнению (3).

ФП: Паспорт проекта Старшее поколение

предельно по РП Дата версии: текущий момент Редакция: Действующая редакция - Р3-2019/004 - 03.07.2019 Версия паспорта: Версия 3

1.1. Сведения 10.1. Периодический мониторинг

Август, 2019

Сведения о достижениях результатов

Наименование	Печать	Просмотр	План	Факт/Прогноз	Просрочка	Статус исполнения	Достижение	Тип документа исполнения	Ответственный	Статистика
Р3.01.04 Не менее 23,0000 Мониторинг			15.12.2019					Информация РП	Яковлева Татьяна В...	Сводная информация по ответственному за выбранный период
(01) Утверждение...			30.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РП	Яковлева Татьяна В...	Результаты: Всего: 2 Ответственный за: 0 Предоставлены исполнения: 1 Контрольные точки:
(03) Внесены изменения в порядок ...			31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РП	Яковлева Татьяна В...	

Р3.01.21 Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций обслуживания субъектов, которых начато строитель...

1,0000

(01) Земель...

Информация об исполнении Результата

Обновить Добавить Редактировать Просмотр Удалить Печать Направить на согласование Реестр согласования Отчеты

Включено в отчет	Месяц	Год	Номер	Тип	Тип документа исполнения	Статус согласования	Этап согласования	Дата создания
------------------	-------	-----	-------	-----	--------------------------	---------------------	-------------------	---------------



1. Для контрольных точек, у которых имеются связанные мероприятия, поле «Дата исполнения» будет недоступно для редактирования до тех пор, пока не будет создано исполнение хотя бы одного связанного мероприятия.
2. В карточке исполнения КТ поле «Дата исполнения» заполнится значением наибольшей даты среди всех исполнений мероприятий. При этом имеется возможность выбрать вручную дату больше.

Исполнение КТ значимия результата

Сохранить Сохранить и закрыть Просмотр версий Открыть КТ Август, 2019

Сведения Мероприятия Риски Контрольные точки РП

Наименование результата:
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)

Наименование КТ:
Земельный участок предоставлен заказчику

Год: 2019 Месяц: Август Тип документа исполнения: Информация РП

Дата достижения (план): 31.08.2018	Дата исполнения: 15.09.2019	Просрочка: 15	Тип исполнения: Прогноз	Информация о достижении: В работе	Статус исполнения: Наличие некритических отклонений	Тип статуса: Основной
------------------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------

Подтверждающие сведения

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа	Файл	Ссылка
...

Стр. 0 из 0 Записей 50 Нет данных для отображения

Комментарий:
В работе.
Просрочка 15 дней.
Существует риск недостижения в срок.
Риск несвоевременного заключения контракта на строительство. Причина риска: Участок предоставляется заказчику после заключения контракта на строительство. На текущую дату контракт не заключен. Вероятность: 40%. Последствия

Дополнительные сведения:



1. В паспорте федерального проекта в разделе 10.1 необходимо выбрать контрольную точку, за мероприятия которой надо отчитаться.
2. Перейти на вкладку мероприятия.
3. Для создания исполнения мероприятия необходимо выбрать соответствующую строку и нажать на кнопку «Мониторинг».

Исполнение КТ значения результата

Сохранить Сохранить и закрыть Просмотр версий Открыть КТ Август, 2015

Сведения **Мероприятия** Риски Контрольные точки РП

Обновить Мониторинг Сведения не представлены

Наименование	Статус исполнения	Дата окончания		Тип исполнения	Информация о достижении	Автор	Дата последнего редактирования	Выполнено в прошлом периоде
		План	Факт/прогноз					
Обеспечение заключения контракта	Выполнено	31.08.2019	31.08.2019	Факт	Выполнено	Мезенцева Лилия Сергеевна	03.09.2019	Нет

Исполнение мероприятия КТ

Сведения Риски

Наименование результата:
Приорит. технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)

Наименование контрольной точки:
Земельный участок предоставлен заказчику

Мероприятие:
Обеспечение заключение контракта

Дата достижения (план):	Дата исполнения:	Просрочка:	Тип исполнения:	Информация о достижении:	Статус исполнения:
31.08.2019	31.08.2019	0	Факт	Выполнено	Отсутствие отклонений

Подтверждающие сведения

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа	Файл	Ссылка
О предоставлении заказчику участка земли	115/32-п	27.08.2019	Постановление		

Стр. 1 из 1 | Записей 50 | Записи с 1 по 1, всего 1

Комментарий:
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении заказчику участка земли" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2019г. №115/32-п, приложен файл.



1. В открывшемся окне поле «Дата исполнения» заполняются вручную с клавиатуры.
2. Область «Подтверждающие сведения» заполняется вручную с клавиатуры. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» и ввести сведения о подтверждающем документе и прикрепить подтверждающий документ или ссылку на него.
3. Выполняется проверка на наличие подтверждающего документа.

Подтверждающие документы

Сохранить Сохранить и закрыть Закреть

Проект

Вид документа:
Постановление

Принявший орган:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Номер документа: 115/32-п Дата документа: 27.08.2019

Наименование:
О предоставлении заказчику участка земли

Ссылка: Перейти

Файл:
Подтверждающие сведения 1



1. После заполнения информации об исполнении для всех мероприятий контрольной точки автоматически заполнится дата исполнения контрольной точки.
2. Выполняется проверка на наличие подтверждающего документа.
3. Если дата исполнения КТ больше даты достижения (план), то требуется создать риски КТ во вкладке «Риски».
4. Для создания риска КТ необходимо нажать «Добавить» и заполнить поля карточки.

Исполнение КТ значения результата

Сохранить Сохранить и закрыть Просмотр версий Открыть КТ Август, 2018

Сведения Мероприятия **Риски** Контрольные точки РП

Риски КТ

Обновить + Добавить Редактировать Удалить

Статус Наименование

Риск несвоевременного заключения контракта на строительство

Стр. 1 из 1 Записей: 50 Записи с 1 по 1, всего 1

Риски мероприятий

Обновить Добавить в текущую информацию Просмотр

Статус Наименование

Риск КТ

Сохранить и закрыть

Сведения

Контрольная точка:
Земельный участок предоставлен заказчику

Риск

Наименование: Риск несвоевременного заключения контракта на строительство
Вероятность возникновения: 40%

Риск закрыт

Причина возникновения:
Участок предоставляется заказчику после заключения контракта на строительство. На текущую дату контракт не заключен.

Последствия наступления

✓ Временные Ожидаемая дата: 15.09.2018 Стоймостьные Сумма последствий, тыс.руб.

Сутевые Последствия наступления:

Зона полномочий для решения: Руководитель проекта Статус: Наличие некритических степеней

Предлагаемые решения

Обновить + Добавить Удалить

Описание Срок исполнения Комментарий Признак выполнения

1 Мероприятия по обеспечению ... 05.09.2018



1. Для внесения исполнения по результату в паспорт федерального проекта в разделе 10.1 за определенный месяц необходимо выбрать результат и перейти к его заполнению.
2. Добавить и заполнить поля карточки.

ФП: Паспорт проекта Старшее поколение

вспределению по РП Дата версии: текущий момент Редакция: Действующая редакция - РЗ-2019/004 - 03.07.2019 Версия паспорта: Версия 3

1.1. Сведения 10.1. Периодический мониторинг

Август, 2019

Сведения о достижении результатов

Обновить Реестр Сформировать отчет Легенда Скрыть КТ и мероприятия РФП

Наименование	План	Факт/Прогноз	Просрочка	Статус исполнения	Достижение	Тип документа исполнения
Дата окончания	Дата окончания					
Р3.01.04 Не менее 70 процентов старше ...		15.12.2019				Информация РФП
23.0000	15.12.2019	15.12.2019	0	Отсутствие отклонений	В работе	Информация РФП
(01) Утверждены (одобрены, сформир...	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РФП
(02) Внесены изменения в проект	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РФП
Р3.01.21 Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)						Информация РФП
1,0000						
(01) Земельный участок пред						
(01) Обеспечение заключе						

Информация об исполнении Результата

Обновить Добавить Редактировать Просмотр Удалить Печать Направить на согласование Реестр согласования Отчеты

Включено в отчет	Месяц	Год	Номер	Тип	Тип документа исполнения	Статус согласования	Этап согласования	Дата создания
Нет	Август	2019	Р3.00-12-2019.08.21/0003	Основной	Информация РФП	02.09.2019 18:37:54

Стр. 1 из 1 | Записей: 50 | Записи с 1 по 1, всего 1



1. Необходимо выбрать значение результата и перейти к его заполнению.
2. Указать дату исполнения и значение результата (факт/прогноз).

Сведения | Контрольные точки и мероприятия | Риски | Финансовое обеспечение | Характеристика | Результаты РП

Задача:
(01) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

Код: 21 Наименование результата:
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в к

Год: 2019 Месяц: Август Тип статуса: Основной Тип документа исполнения: Информация РФП

Комментарий:

Значения результата

Значение(план)	Значение(факт/прогн...
1	1

Обновить | Мониторинг | Удалить

Исполнение значения результата

Сохранить | Сохранить и закрыть | Закреть

Наименование результата:
(21) Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации

Значение(план): 1 Значение(факт/прогноз): 1 Тип документа исполнения: Информация РФП

Дата достижения (план): 22.12.2019 Дата исполнения: 22.12.2019 Просрочка: 0 Тип исполнения: Прогноз

Информация о достижении: В работе Статус исполнения: Отсутствие отклонений Тип статуса: Основной

Комментарий:
В работе.



1. Для заполнения данных по исполнению бюджета необходимо перейти на вкладку «Финансовое обеспечение» (1)
 - Поле «Результат» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
 - Поле «Год» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
 - Поле «Месяц» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
 - Поле «Статус» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
 - Поле «Тип статуса» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
2. Для заполнения/обновления информации в табличной части «Сведения об исполнении бюджета, тыс.руб.» необходимо нажать кнопку «Перерасчет»

Информация об исполнении результата

Сохранить Сохранить и закрыть Просмотр версий Открыть результат

Сведения Контрольные точки и мероприятия Риски **Финансовое обеспечение** Характеристика Результаты РП

Результат:
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкц

Год: 2019 Месяц: Август Тип статуса: Основной Тип документа исполнения: Информация РП

Сведения об исполнении бюджета, тыс.руб

Перерасчет Обновить Сохранить Риск Детализация по КБК

Наименование	Объем финансового обеспечения			Исполнение		Процент исполнения	Риск исполнения бюджета
	Предусмотрено паспортом ФП	СБР	ЛБО	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
* Задача: (01) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения							
(21) Прирост технической готовности объе...	2 054 659,03	2 054 659,03	2 054 659,03	2 054 659,03	2 541,66	0,12	0,00
федеральный бюджет	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	588 085,57	29,40	1 411 914,43
межбюджетные трансферты, феде...	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	588 085,57	29,40	1 411 914,43
консолидированные бюджеты субъект...	2 054 659,03	2 054 659,03	2 054 659,03	2 054 659,03	2 541,66	0,12	0,00



1. Для формирования информации по сводным рискам необходимо перейти в раздел 10.2 «Реестр рисков»
2. В нижней части видны риски Контрольных точек, мероприятий и результатов
3. Для добавления в раздел «Ключевые риски» необходимо нажать «Добавить в сводные риски»
4. После этого выбрать необходимые ключевые риски и нажать «Сформировать информацию»
5. Направить информацию о рисках на согласование


The screenshot displays the '10.2. Реестр рисков' (Risk Register) interface. The left sidebar shows a navigation tree with '10.2. Реестр рисков' selected. The main area is divided into three sections:

- Информация о рисках:** A table with columns: Месяц, Год, Дата создания, Номер, Тип, and Согласование (with sub-columns: Этап, Статус). Buttons include 'Печать', 'Обновить', 'Редактировать', 'Удалить', and 'Направить на согласование'.
- Ключевые риски:** A table with columns: Наименование, Вероятность, Дата откры..., Дата закры..., Причина возникновения, Последствия наступления (Временные, Стоимости..., Сутевые), Последняя... дата из пре... решений, and Включен в информацию. A red box highlights the 'Сформировать информацию' button.
- Риски проекта:** A table with columns: Год, Месяц, Наименование рез... КТ/мероприятия, Тип риска, Статус..., Наименование, Вероят..., Дата от..., Дата за..., Причина возникновения, Последствия наступления (Временные, Стоимости..., Сутевые), and Тип документа исполнения. A red box highlights the 'Добавить в сводные риски' button.

A sample risk entry is visible in the 'Риски проекта' table:

Год	Месяц	Наименование рез... КТ/мероприятия	Тип риска	Статус...	Наименование	Вероят...	Дата от...	Дата за...	Причина возникновения	Последствия наступления	Тип документа исполнения
19	Август	РЗ.01.21 (01) Земельный участок предоставлен заказчику	КТ		Риск несвоевременного заключения контракта на строительство	40%	03.09.20...		предусмотрены заказчику после заключения контракта на строительство. На текущую дату	Да, Нет, Нет	Информация РЭП


На основании утвержденных результатов необходимо сформировать отчет. Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку «Сформировать отчет»

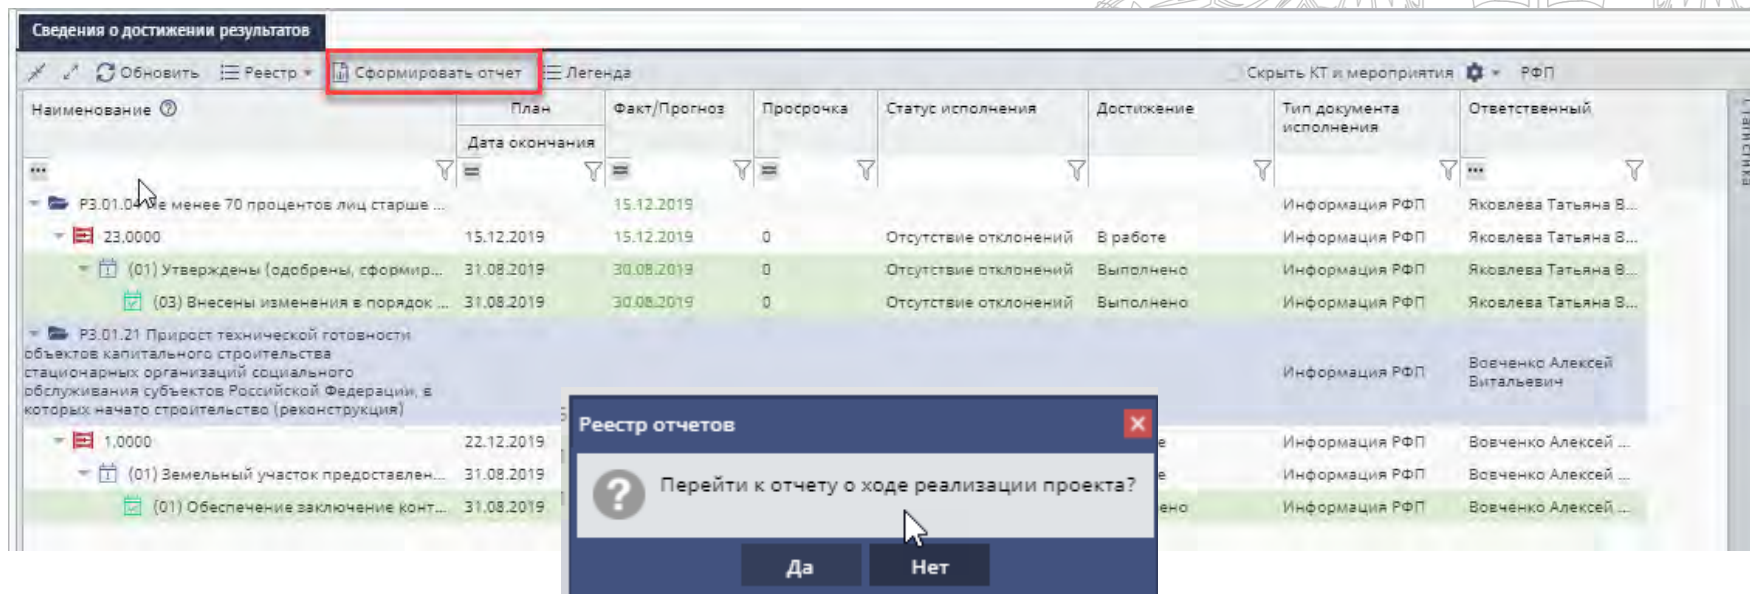

The screenshot displays a software interface with a table titled "Сведения о достижении результатов". A red box highlights the "Сформировать отчет" button in the top navigation bar. A dialog box titled "Реестр отчетов" is open in the foreground, asking "Перейти к отчету о ходе реализации проекта?" with "Да" and "Нет" buttons.

Наименование	План	Факт/Прогноз	Просрочка	Статус исполнения	Достижение	Тип документа исполнения	Ответственный
	Дата окончания						
РЗ.01.04.01 Не менее 70 процентов лиц старше ...		15.12.2019				Информация РФП	Яковлева Татьяна В...
23,0000	15.12.2019	15.12.2019	0	Отсутствие отклонений	В работе	Информация РФП	Яковлева Татьяна В...
(01) Утверждены (одобрены, сформир...	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РФП	Яковлева Татьяна В...
(03) Внесены изменения в порядок ...	31.08.2019	30.08.2019	0	Отсутствие отклонений	Выполнено	Информация РФП	Яковлева Татьяна В...
РЗ.01.21 Приrost технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)						Информация РФП	Вовченко Алексей Витальевич
1,0000	22.12.2019					Информация РФП	Вовченко Алексей ...
(01) Земельный участок предоставлен...	31.08.2019					Информация РФП	Вовченко Алексей ...
(01) Обеспечение заключение конт...	31.08.2019					Информация РФП	Вовченко Алексей ...

1. В сформированном отчете существует возможность просмотра разделов
2. По кнопке «Печать» происходит формирование печатной формы отчета
3. По кнопке «Синхронизация с паспортом» происходит синхронизация с паспортом и обновление данных отчета на основании паспорта

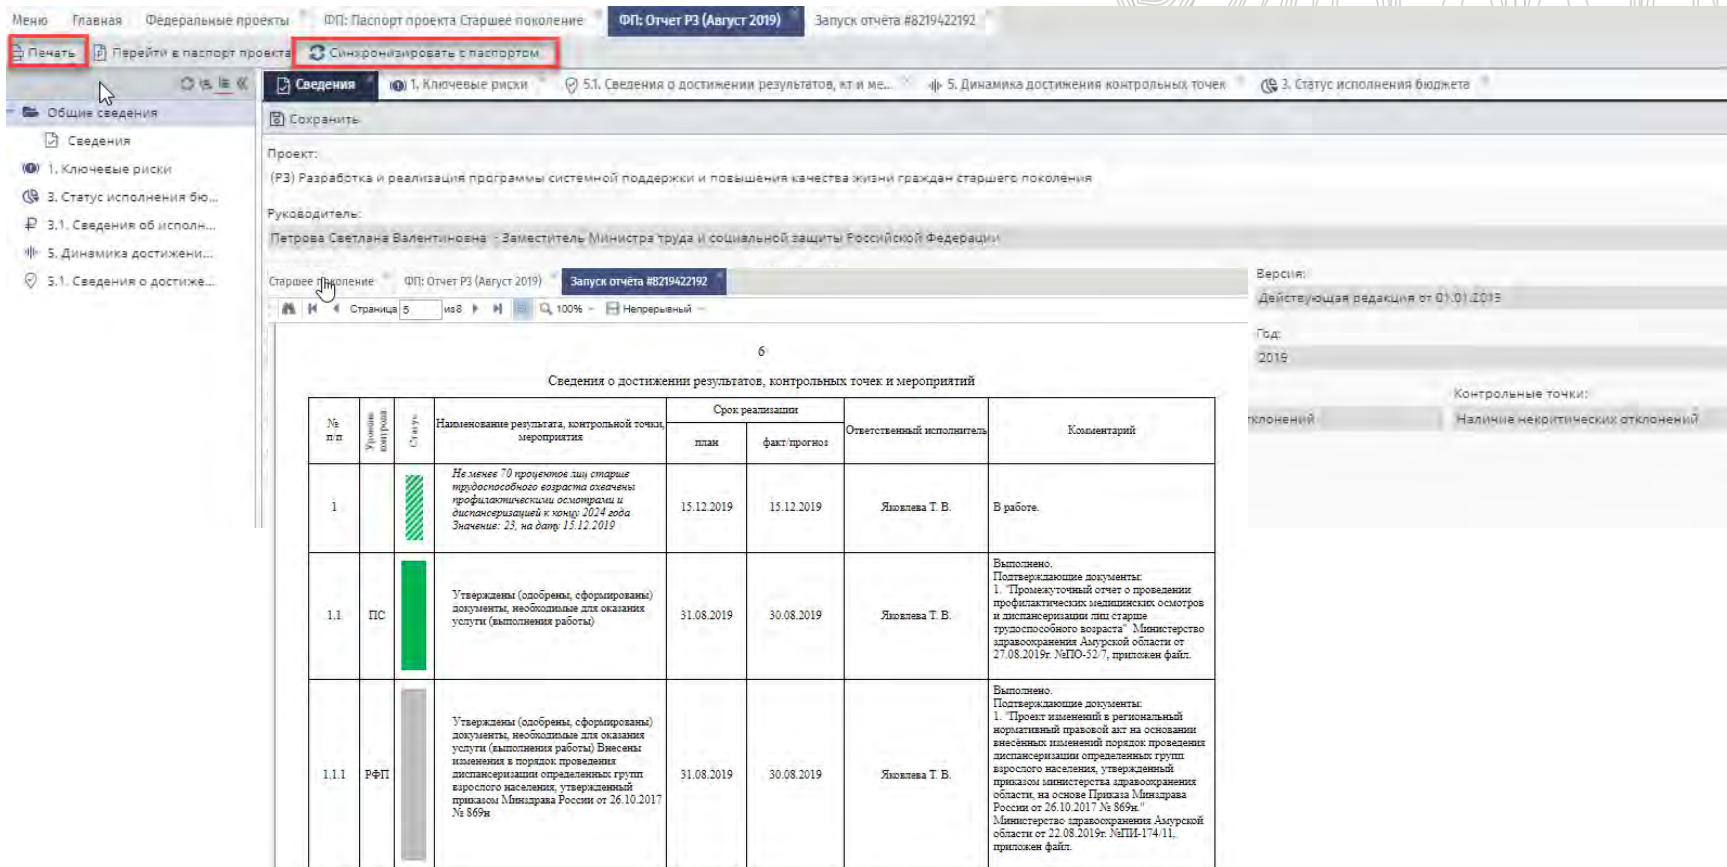

Меню Главная Федеральные проекты ФП: Паспорт проекта Старшее поколение ФП: Отчет РЗ (Август 2019) Запуск отчёта #8219422192

Печать Перейти в паспорт проекта Синхронизировать с паспортом

Общие сведения

- Сведения
- 1. Ключевые риски
- 3. Статус исполнения бю...
- 3.1. Сведения об исполн...
- 5. Динамика достижение...
- 5.1. Сведения о достиже...

Сохранить

Проект:
(РЗ) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

Руководитель:
Петрова Светлана Валентиновна - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Старшее поколение ФП: Отчет РЗ (Август 2019) Запуск отчёта #8219422192

Версия:
Действующая редакция от 01.01.2015

Год:
2019

Контрольные точки:
клонений Наличие не критических отклонений

6

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ пп	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт: прогноз		
1			Не менее 70 процентов лиц старшего поколения ежегодно проходят профилактические осмотры и диспансеризацию к концу 2014 года Значение: 23, на дату 15.12.2019	15.12.2019	15.12.2019	Яковлева Т. В.	В работе.
1.1	ПС		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.08.2019	30.08.2019	Яковлева Т. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Промежуточный отчет о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц старшего трудоспособного возраста. Министерство здравоохранения Амурской области от 27.08.2019г. №ПТО-52/7, приложен файл.
1.1.1	Р-ФП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Бизнеса изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н	31.08.2019	30.08.2019	Яковлева Т. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Проект изменений в региональный нормативный правовой акт на основании вносимых изменений порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом министерства здравоохранения области, на основе Приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. Министерство здравоохранения Амурской области от 22.08.2019г. №ПШ-174.11, приложен файл.

Страница 5 из 8 100% Непрерывный

Информация об исполнении результата, рисках и отчете подлежит утверждению со стороны проектного офиса.

Для направления на согласование информации по исполнению необходимо:

- в реестре исполнения выбрать соответствующую запись;
- нажать на кнопку «Направить на согласование»
- нажать на кнопку «Да» при уточнении отправки на согласование
- нажать кнопку «Да» при уточнении перехода в реестр согласования
- Согласование информации об исполнении результата происходит в реестре *«Согласование информации для включения в отчет»*




Формирование и изменение паспорта федерального проекта

Руководитель федерального проекта / Администратор федерального проекта / Участник федерального проекта

Ввод данных/Согласование/Утверждение

Полный перечень необходимых полномочий можно посмотреть в разделе «Справочная информация» меню «Реестр заявок на регистрацию пользователей»



Меню ▾ Главная Реестр заявок на регистрацию ... ✕

Создать новую заявку Обновить Печать ▾ Согласование

Справочная информация

Глава по БК: ... ✕

МФ	Статус резолюции	Революция	Статус заявки	Рассмотрение ФК	Номер заявки	Дата создания заявки	Дата подписания заявки	Дней до окончания рассмотрения	Глава по БК	Наименование главы по БК	суб
		Пусто	Пусто	Нет	35-2/00477	29.05.2019					
		Пусто	Утверждено	Нет	35-2/00476	29.05.2019	29.05.2019	3			
