



МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработка рабочих планов паспортов
федеральных проектов с учетом требований
методических указаний, направленных
письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2020 года П6-79372



- Нормативно-правовая база
- Форма рабочего плана федерального проекта
- Структура рабочего плана
- Сроки утверждения рабочих планов
- Порядок заполнения рабочих планов
- Особенности заполнения рабочих планов по типу результата «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества»
- Особенности заполнения рабочих планов по типу результата «Принятие НПА»
- Порядок подключения к работе с рабочими планами
- Обзор экранных форм интерфейсов по формированию рабочих планов
- Перечень ФЛК

Нормативная правовая база:

Методические рекомендации по разработке и внесению изменений в рабочие планы федеральных проектов от 16.12.2020

Рабочий план федерального проекта разрабатывается:

- В целях детализации плана мероприятий по реализации федерального проекта по отдельным типам результатов проекта;
- На срок реализации федерального проекта;
- Детализируется ежегодно по результатам (контрольным точкам), реализация которых предусмотрена в соответствующем году в соответствии с планом реализации;
- Согласуется администратором федерального проекта;
- Утверждается руководителем федерального проекта в течение месяца после утверждения паспорта федерального проекта.



РАБОЧИЙ ПЛАН
федерального проекта
(наименование федерального проекта)

I. Результаты федерального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕН)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕН)	
										код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результаты федерального проекта, значения которых не распределены и не подлежат распределению по субъектам Российской Федерации											
1.		(указывается результат федерального проекта)				X	X	X	X	X	X
1.1.		(указывается результат федерального проекта в ___ году реализации)				X	X	X	X	X	X
1.1.K.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ___ году реализации)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ___ году)									
1.1.1.K.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ___ году)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Результаты федерального проекта, предусматривающие финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества) государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)											
2.		(указывается результат федерального проекта)				X	X	X	X	X	X
2.1.		(указывается результат федерального проекта в ___ году)				X	X	X	X	X	X
2.1.K.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ___ году)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ___ году)									

 Автоматическое заполнение
 Ручной ввод информации

Продолжение формы на следующем слайде



РАБОЧИЙ ПЛАН
федерального проекта
(наименование федерального проекта)

I. Результаты федерального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Сроки реализации ³		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)		Ответственный исполнитель ⁶					Наименование субъекта Российской Федерации ⁷	Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁸
			начало	окончание	всего	из них: федеральный бюджет	ФНО	должность	организация ⁹					
									наименование	ИНН	КПП			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Результаты федерального проекта, значения которых не распределены и не подлежат распределению по субъектам Российской Федерации														
1.		(указывается результат федерального проекта)										X		
1.1.		(указывается результат федерального проекта в ____ году реализации)										X		
1.1.К.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ____ году реализации)	X		X	X						X		
1.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ____ году)										X		
1.1.1.К.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ____ году)	X		X	X						X		
Результаты федерального проекта, предусматривающие софинансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества) государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)														
2.		(указывается результат федерального проекта)										X		
2.1.		(указывается результат федерального проекта в ____ году)										X		
2.1.К.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ____ году)	X		X	X						X		
2.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ____ году)					X	X	X	X	X			

Автоматическое заполнение
 Ручной ввод информации



II. Результаты федерального проекта, предусматривающие разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Сроки реализации ³		Ответственный исполнитель ⁴					Характеристика	
						начало	окончание	ФИО	должность	организация ⁵				
										наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Результаты федерального проекта, значения которых не распределены и не подлежат распределению по субъектам Российской Федерации														
1.		(указывается результат федерального проекта)												
1.1.		(указывается результат федерального проекта в ___ году реализации)												
1.1.К.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ___ году реализации)	X	X	X	X								
1.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ___ году)												
1.1.1.К.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ___ году)	X	X	X	X								

Автоматическое заполнение
 Ручной ввод информации



Общий план

Результат

Ответственный за результат

Дата достижения результата

КТ результата

Ответственный за КТ

Дата достижения КТ



Справочник «Перечень ОКС»

ОКС в части ФАИП

Уточненный ОКС для
соглашений

Рабочий план

Результат

КТ результата

Ответственный за результат

Дата достижения результата

Заказчик

Ответственный исполнитель
организации заказчика

Объект


Ответственный исполнитель
объекта результата

Дата достижения объекта

КТ объекта результата

Ответственный за КТ объекта результата

Дата достижения КТ объекта результата



- Автоматическое формирование рабочих планов федеральных проектов выполнено 11 января 2021 г.
- Возможность редактирования сведений в рабочих планах федеральных проектов доступна с 12 января 2021 г.
- Срок утверждения рабочих планов **01 марта 2021 г.**

Рабочий план состоит:

Результат
КТ объекта результата
Ответственный за результат
Дата достижения результата
Заказчик
Ответственный исполнитель
организации заказчика
Объект
Ответственный исполнитель
объекта результата
Дата достижения объекта
КТ объекта результата
Ответственный за КТ объекта
результата
Дата достижения КТ объекта
результата

**Участник проекта вносит изменения
по следующим элементам:**

Ответственный исполнитель:
заказчика, объекта результата, КТ
объекта результата
Дата достижения: заказчика, объекта
результата, КТ объекта результата
Добавление дополнительных КТ
объектов результата
Установление вида работ результата
Добавление характеристики к
объектам, КТ
Привязка объектов результата из
строки «Нераспределенные
значения» к значению результата

**Сведения, которые попадают в
ПФ Рабочего плана:**

Результат, тип результата
КТ результата (из Плана мероприятий)
Ответственные исполнители
результата, КТ результата
Даты достижения результата, КТ
результата
Объект (мощность объекта, сроки
реализации, объем финансового
обеспечения, адрес, сведения о
местонахождении, характеристика)
КТ объекта результата
Ответственные исполнители объекта
результата, КТ объектов результата
Даты достижения объектов
результата, КТ объектов результата



Для результатов ФП с типом «Строительство», выполняемых на федеральном уровне

1

Автоматическое формирование рабочего плана

2

Распределение ОКС по значениям результата

3

Назначение ответственного за объект

4

Редактирование данных объекта результата

5

Добавление дополнительной контрольной точки

6

Отправка на согласование



Источники ОКС:

- ▶ ФАИП
- ▶ Соглашения

- ▶ Объект указывается в том году значения результата, по которому год окончания реализации совпадает с годом реализации проекта;

В случае необходимости внесения изменений в данные по объектам капитального строительства, они должны осуществляться в программном модуле «Бюджетные инвестиции» подсистемы бюджетного планирования системы «Электронный бюджет»;

- ▶ Часть объектов результатов не может быть автоматически распределена по значениям результатов. Такие объекты результатов отображаются в секции «Нераспределенные значения»;
- ▶ Объекты, реализуемые в субъектах РФ, детализируются в рабочих планах региональных проектов;

- ▶ В сводном рабочем плане агрегируется информация как об объектах, реализуемых на федеральном уровне, так и об объектах, реализуемых на территории субъектов РФ.



Для результатов ФП с типом «Принятие НПА», выполняемых на федеральном уровне

1

Автоматическое формирование рабочего плана

2

Добавление заказчика для значения результата

3

Добавление объекта для значения результата

4

Добавление дополнительной контрольной точки объекта результата

6

Отправка на согласование



Источники:

- ▶ Автоматическое определение заказчика объекта (органа, ответственного за разработку) НПА
- ▶ Ручной ввод данных по объекту (выбор вида НПА из справочника, наименования, органа, принимающего документ).

▶ Под заказчиком объектов результатов с типом «Принятие нормативного правового акта» подразумевается ФОИВ, ответственный за разработку НПА.

▶ Данные в секции «Заказчик» по умолчанию заполняются на основе сведений об организации ответственного исполнителя, указанного в разделе «Общий план» паспорта федерального проекта, с возможностью последующей корректировки.



- В настоящее время возможность формирования рабочих планов федеральных проектов предоставлена участникам проекта с функциональной ролью администратора проекта и ответственного за результат.
- В случае если в процессе формирования рабочего плана требуется участие ответственных исполнителей объектов и (или) контрольных точек, следует:
 1. Указанным лицам в установленном порядке сформировать и направить заявки на регистрацию уполномоченных лиц с указанием полномочия;
 2. Добавить должностные лица в команду проекта;
 3. Осуществить назначение ответственных за объект/контрольные точки объекта.
- Полномочия для разработки и внесение изменений в рабочий план федерального проекта:
 - УНП. Согласование рабочего плана проекта
(Ввод данных, Согласование, Утверждение, Просмотр).



Распределение результатов с типом «Строительство»:

1. Формирование рабочего плана начинается с распределения результатов проекта по Заказчикам, объектам, а также с формирования информации о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках в разделе меню паспорта федерального проекта «13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам».

Федеральные проекты × ФП: Паспорт проекта Инфраструктура для обращения с отходами I-... ×

Печать паспорта × Перейти к распределению по РП Дата версии: текущий момент Редакция: Действующая редакция - G3-2020/012 - 19.11.20 × Версия паспорта: Версия 14 ×

Обновить Редактировать Фильтр по заказчику Получить последнюю версию проекта из УНП

Тип результата	Единица измерения	Реализуется регионом	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток
G3.03.03 Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности Значение: 1,0000, Дата достижения: 31.12.2020, единица измерения: Штука							
Принятие норматив...	Штука	Нет	1,0000	31.12.2020	1,0000	1,0000	0,0000
G3.03.06 Перепрофилированы объекты по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Значение: 4,0000, Дата достижения: 29.12.2023, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	4,0000	29.12.2023	4,0000	2,0000	2,0000
G3.03.07 Реализованы инфраструктурные проекты по созданию объектов обращения с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности. Значение: 3,0000, Дата достижения: 31.12.2024, единица измерения: Штука							
Строительство (реко...	Штука	Нет	3,0000	31.12.2024	3,0000	0,0000	3,0000

Заказчики

Заказчик	ИНН	Распределено значений
...	...	29.12.2023
Итого:		2,0000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РО...	7706413348	2,0000

13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам



2. В окне редактирования результата отражаются данные, сформированные автоматически на основании данных паспорта проекта (результаты, в рамках которых реализуются объекты капитального строительства и декомпозированные КТ из Общего плана проекта) и данных по объектам капитального строительства из программного модуля «Бюджетные инвестиции» подсистемы бюджетного планирования системы «Электронный бюджет».

(A1.01.03) Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Обновить Добавить Просмотр Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда Скрыть КТ Скрыть неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	ИНН	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
Значение результата на 01.12.2020: распределено 1,0000 из 1,0000								
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646				Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ...		000000000350...			Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(1) Земельный участок предоставлен заказчику				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(2) Получены положительные заключения по результатам государственных эк...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(3) Получено разрешение на строительство (реконструкцию)				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(4) Строительно-монтажные работы завершены				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(5) Оборудование приобретено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(6) Оборудование установлено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(7) Оборудование введено в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(8) Техническая готовность объекта, %				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(9) Заключение органа государственного строительного надзора получено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества п...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(12) Закупка включена в план закупок				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реес...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказа...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанн...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физи...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсид...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...



3. Для корректировки данных необходимо выбрать объект и нажать кнопку «Редактировать».

(A1.01.03) Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Обновить Добавить Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда

Скрыть КТ Скрыть неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	ИНН	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
Значение результата на 01.12.2020: распределено 1,0000 из 1,0000								
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТ...	7705443646				Единица	1,0000	01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
00000000035026 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а. Внесение изменений								
(1) Земельный участок предоставлен заказчику				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	Осинцев Владимир Геннад...
(2) Получены положительные заключения по результатам государственных эк...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(3) Получено разрешение на строительство (реконструкцию)				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(4) Строительно-монтажные работы завершены				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(5) Оборудование приобретено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(6) Оборудование установлено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(7) Оборудование введено в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(8) Техническая готовность объекта, %				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(9) Заключение органа государственного строительного надзора получено				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества п...				<input checked="" type="checkbox"/>			01.12.2020	
(12) Закупка включена в план закупок				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	
(13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реес...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	
(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказа...				<input type="checkbox"/>			01.12.2020	



4. В открывшемся окне для редактирования доступно:

- изменение ответственного исполнителя для Заказчика (по умолчанию указан руководитель организации Заказчика);
- выбор вида работ результата по объектам результата (при выборе вида работ набор декомпозированных контрольных точек из паспорта проекта из раздела «Общий план» может измениться);
- изменение ответственного исполнителя объекта результата;
- создание дополнительных контрольных точек объекта результата.

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Заказчик

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "У" ИНН: 7705443646 КПП: 770701001

Ответственный исполнитель: Осинцев Владимир Геннадьевич Должность: Заместитель Министра культуры РФ

Объект

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта Распределены все значения результата 1,0000 на 01.12.2021

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Координаты согласно ГЛОНАСС	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
0000000035026	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного	Не указано			01.12.2021	Осинцев Владимир Геннадьевич	

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется

Распределение результатов с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта»:
8. Для распределения результата федерального проекта с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта» необходимо выбрать результат федерального проекта, у которого в колонке «Реализуется регионом» указано значение «Нет», и нажать кнопку «Редактировать»

Федеральные проекты × ФП: Паспорт проекта Кадры для цифровой экономики ×

Печать паспорта 🖨️ Перейти к распределению по РП 🏠 Дата версии: текущий момент Редакция: Действующая редакция - D3-2020/024 - 07.11.20 🔍 🗑️ ✖️ Версия паспорта: Версия 19 🔍 ✖️

Обновить 🔄 Редактировать ✎ Фильтр по заказчику 📏 Получить последнюю версию проекта из УНП 📄 ⚙️

Тип результата	Единица измерения	Реализуется регионом	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток
D3.03.79 Подготовлены проекты нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (ежегодно) Значение: 112,0000, Дата достижения: 31.12.2024, единица измерения: Штука							
Принятие нормативного правового (правового) акта	Штука	Нет	107,0000	31.12.2020	107,0000	0,0000	107,0000
Принятие норматив...	Штука	Нет	112,0000	31.12.2021	112,0000	0,0000	112,0000
Принятие норматив...	Штука	Нет	112,0000	31.12.2022	112,0000	0,0000	112,0000
Принятие норматив...	Штука	Нет	112,0000	31.12.2023	112,0000	0,0000	112,0000
Принятие норматив...	Штука	Нет	112,0000	31.12.2024	112,0000	0,0000	112,0000

Заказчики

Заказчик	ИНН	Распределено значений				
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
...
Итого:		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



9. Под заказчиком объектов результатов с типом «Принятие нормативного правового акта» подразумевается ФОИВ, ответственный за объект результата. Для добавления заказчика и объекта результата необходимо выполнить следующие действия: выделить значение результата, для которого необходимо добавить объект результата, и нажать кнопку «Добавить».

(03.03.79) Подготовлены проекты нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по професс...


Обновить **Добавить** Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда Скрыть КТ Скрыть неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки ↑	ИНН	Вид нормативного пр...	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
...	=	=	...
Значение результата на 31.12.2020: распределено 0,0000 из 107,0000				Штука	107,0000	31.12.2020	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2021: распределено 0,0000 из 112,0000				Штука	112,0000	31.12.2021	Топилин Максим Анатольевич
Значение результата на 31.12.2022: распределено 0,0000 из 112,0000				Штука	112,0000	31.12.2022	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2023: распределено 0,0000 из 112,0000				Штука	112,0000	31.12.2023	Топилин Максим Анатолье...
Значение результата на 31.12.2024: распределено 0,0000 из 112,0000				Штука	112,0000	31.12.2024	Топилин Максим Анатолье...

10. откроется окно «Заказчики и объекты» с возможностью редактирования данных в секции «Заказчик», в поле «Наименование организации» и «Ответственный исполнитель», а также добавления объекта результата и его дополнительных контрольных точек.

Данные в секции «Заказчик» по умолчанию заполняются на основе сведений об организации ответственного исполнителя, указанного в разделе «Общий план» паспорта федерального проекта, с возможностью последующей корректировки.

В случае необходимости редактирования поля «Наименование организации» нужно нажать кнопку «лупа»

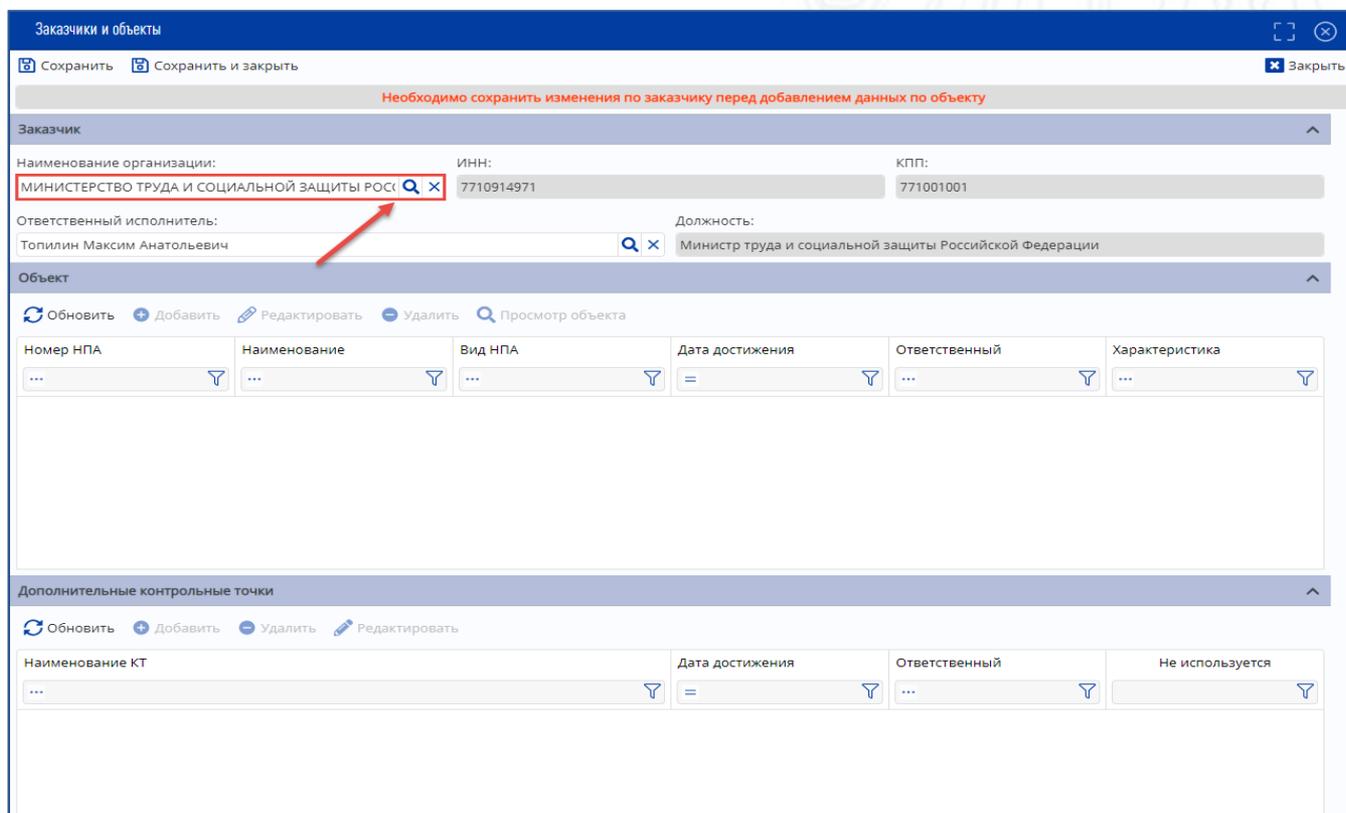

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Необходимо сохранить изменения по заказчику перед добавлением данных по объекту

Заказчик

Наименование организации: ИНН: 7710914971 КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Должность:

Объект

Обновить + Добавить ✎ Редактировать - Удалить 🔍 Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки

Обновить + Добавить - Удалить ✎ Редактировать

Наименование КТ	Дата достижения	Ответственный	Не используется
...	=

11. Добавление объекта результата осуществляется нажатием на кнопку «Добавить».

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Заказчик

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКО
ИНН: 7710914971
КПП: 771001001

Ответственный исполнитель: Никифорова И Г
Должность: Консультант отдела методологии финансово-бюджетной политики, имущественных отношений

Объект

Обновить **Добавить** Редактировать Удалить Просмотр объекта

Номер НПА	Наименование	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	=

Дополнительные контрольные точки



12. Форма добавления объекта с типом результата «Принятие нормативного правового (правового) акта»:

- Поле «Вид НПА » заполняется из выпадающего списка;
- Поле «Орган, принявший документ» заполняется путем выбора значения из соответствующего справочника.
- Поле «Дата достижения» автоматически заполняется датой достижения значения результата. Для редактирования значения необходимо нажать кнопку «Календарь» и выбрать дату.

Добавление объекта

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Статус НПА:
Проект

Наименование:
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об определении федерального оператора по обращению с отход

Вид НПА:
Распоряжение Правительства Р

Орган, принявший документ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата достижения: 31.12.2021


Ответственный исполнитель:
Топилин Максим Анатольевич

Характеристика:

13. Раздел 13.2 «Рабочий план» предназначен для отображения обобщенной информации по результатам проекта: о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках. Отображение данных в Рабочем плане федерального проекта осуществляется в зависимости от роли пользователя. Редактирование данных в разделе «Рабочий план» запрещено.


Через кнопку «Действия» Администратором проекта в разделе 13.2 Рабочий план осуществляется процесс согласования информации ответственных исполнителей.

В колонке «Согласующий» отражается ФИО сотрудника, которому элемент направляется на согласование.

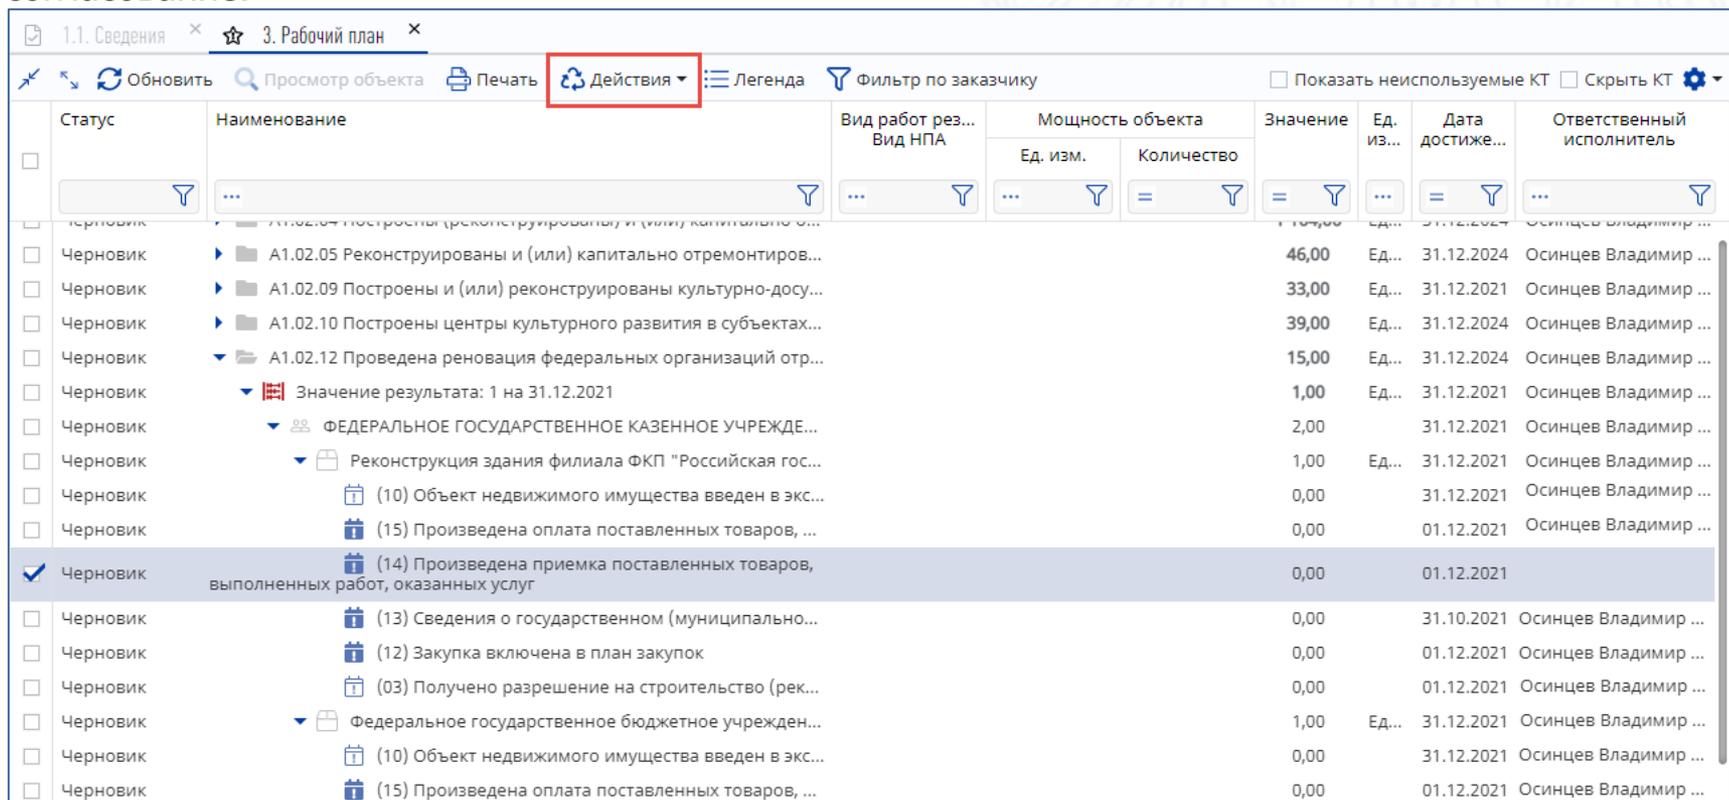


Статус	Наименование	Вид работ рез... Вид НПА	Мощность объекта		Значение	Ед. изм.	Дата достиже...	Ответственный исполнитель
			Ед. изм.	Количество				
<input type="checkbox"/>	Черновик
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.05 Реконструированы и (или) капитально отремонтиров...			46,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.09 Построены и (или) реконструированы культурно-досу...			33,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.10 Построены центры культурного развития в субъектах...			39,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.12 Проведена реновация федеральных организаций отр...			15,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Значение результата: 1 на 31.12.2021			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ...			2,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Реконструкция здания филиала ФКП "Российская гос...			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(10) Объект недвижимого имущества введен в экс...			0,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(15) Произведена оплата поставленных товаров, ...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Черновик	(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг			0,00		01.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Черновик	(13) Сведения о государственном (муниципально...			0,00		31.10.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(12) Закупка включена в план закупок			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(03) Получено разрешение на строительство (рек...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Федеральное государственное бюджетное учрежден...			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(10) Объект недвижимого имущества введен в экс...			0,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(15) Произведена оплата поставленных товаров, ...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...

14. Отправка документа на согласование ВПО осуществляется из раздела меню «13.2 Рабочий план» администратором проекта. Отправка доступна через нажатие на кнопку «Действия» и выбор из списка действий «Направить на утверждение». Кнопка «Направить на утверждение» доступна для результатов в состоянии «Согласовано»

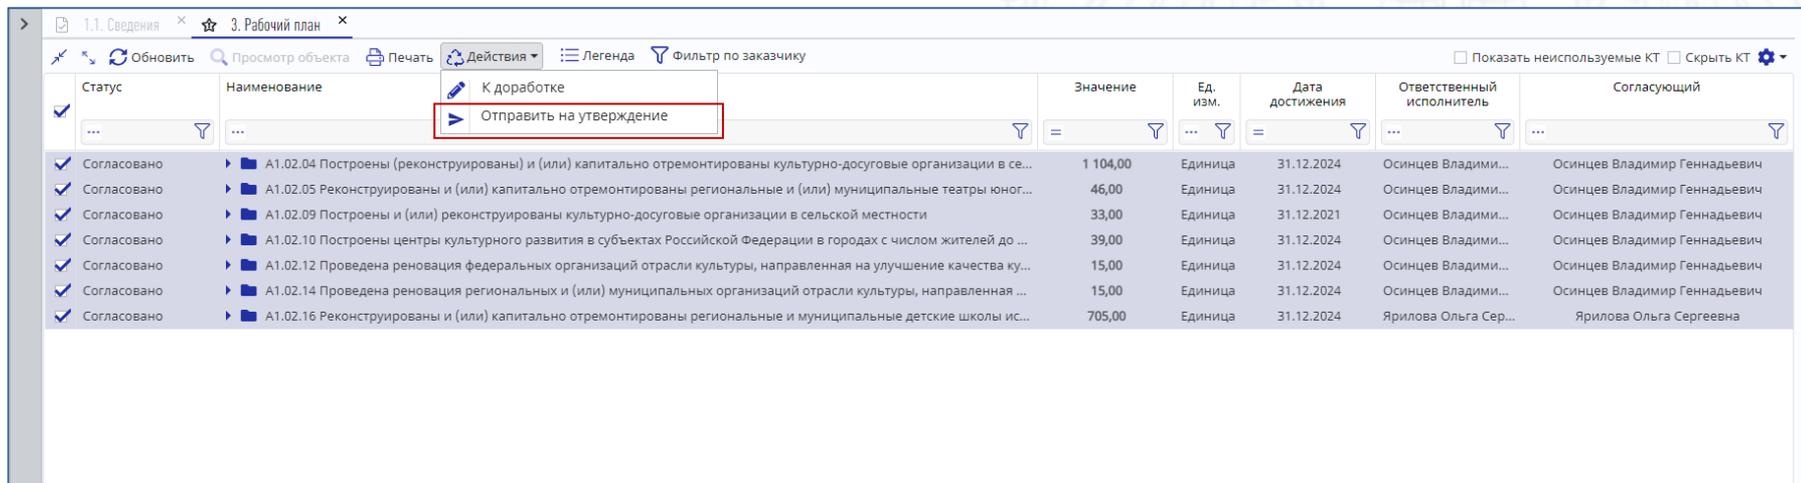

Статус	Наименование	Действия	Значение	Ед. изм.	Дата достижения	Ответственный исполнитель	Согласующий
Согласовано	A1.02.04 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в се...	К доработке Отправить на утверждение	1 104,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.05 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юног...		46,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.09 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности		33,00	Единица	31.12.2021	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.10 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до ...		39,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.12 Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества ку...		15,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.14 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная ...		15,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.16 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы ис...		705,00	Единица	31.12.2024	Ярилова Ольга Сер...	Ярилова Ольга Сергеевна

15. Утверждение Рабочего плана осуществляется в реестре согласования документов (рабочий план ФП).

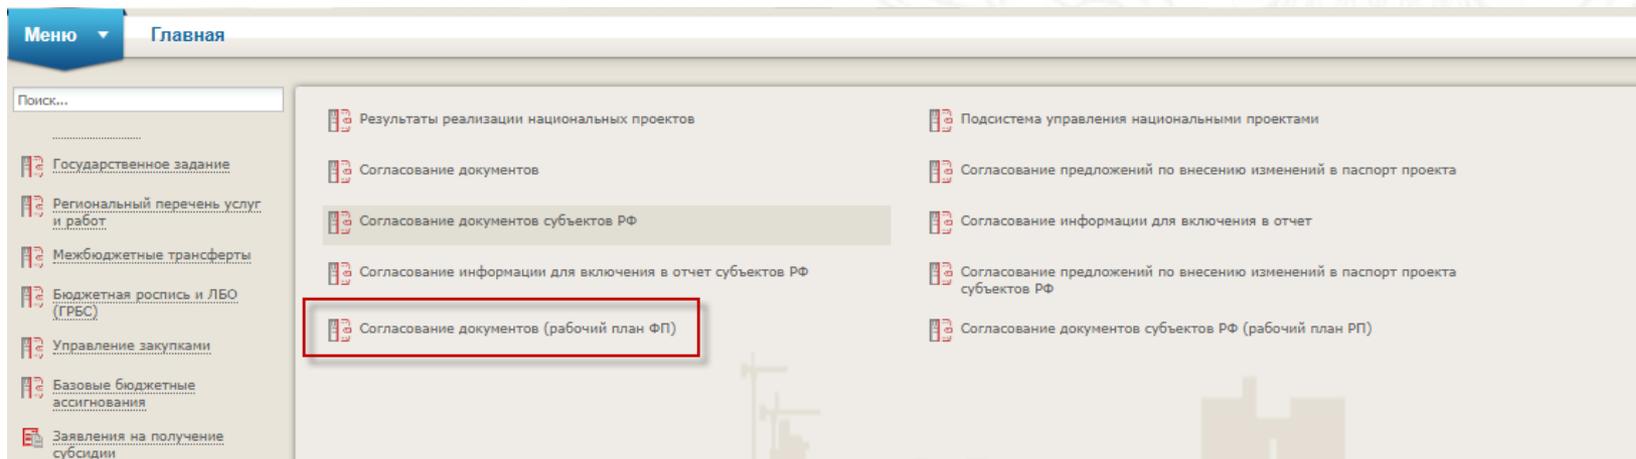

- Утверждение рабочего плана осуществляет руководитель проекта.
- В случае успешного согласования и утверждения рабочего плана в реестре согласования документов (рабочий план ФП) в разделе 13.2 «Рабочий план» статус автоматически изменится на «Утвержден».
- В случае возврата документа на доработку требуется внесение изменений в Рабочий план в разделе 13.1 «Распределение результатов по заказчикам и объектам» в соответствии с причинами возврата на доработку. Статус в разделе 13.2 «Рабочий план» автоматически изменится на «На доработке».



Контроли используемые в рабочих планах

- ▶ Контроль на неперевышение даты достижения значения результата при редактировании даты достижения объекта результата;
- ▶ Контроль на неперевышение даты достижения объекта результата при редактировании даты достижения дополнительной контрольной точки;
- ▶ Контроль на неперевышение значения результата при создании объектов результата с типом «Принятие НПА»;
- ▶ Контроль при отправке документа рабочий план на согласование руководителю проекта на текущий статус согласования результатов.



Ограничения/правила используемые в рабочих планах

- ▶ Ограничение при назначении ответственных исполнителей объектов результатов и контрольных точек (*Назначение ответственным за объект/контрольную точку объекта доступно только для сотрудников организации заказчика*);
- ▶ Ограничение на возможность редактирования в зависимости от выбранной редакции рабочего плана (*Редактирование доступно в состоянии версии рабочего плана «Черновик»*);
- ▶ Ограничение отражения и редактирования данных по ответственности за элемент - результат, объект результата, контрольная точка объекта результата (*В зависимости от роли и участия в проекте, пользователю доступны только определенные элементы рабочего плана*);
